No.1　レジューサー取付管ライニング

工事名　鴨川第 18 処理分区下水道工事（北再-R7-3002）
施工日　2026 年 1 月
φ125～φ150　L 2.9m
引込式（本管　バリ切断）

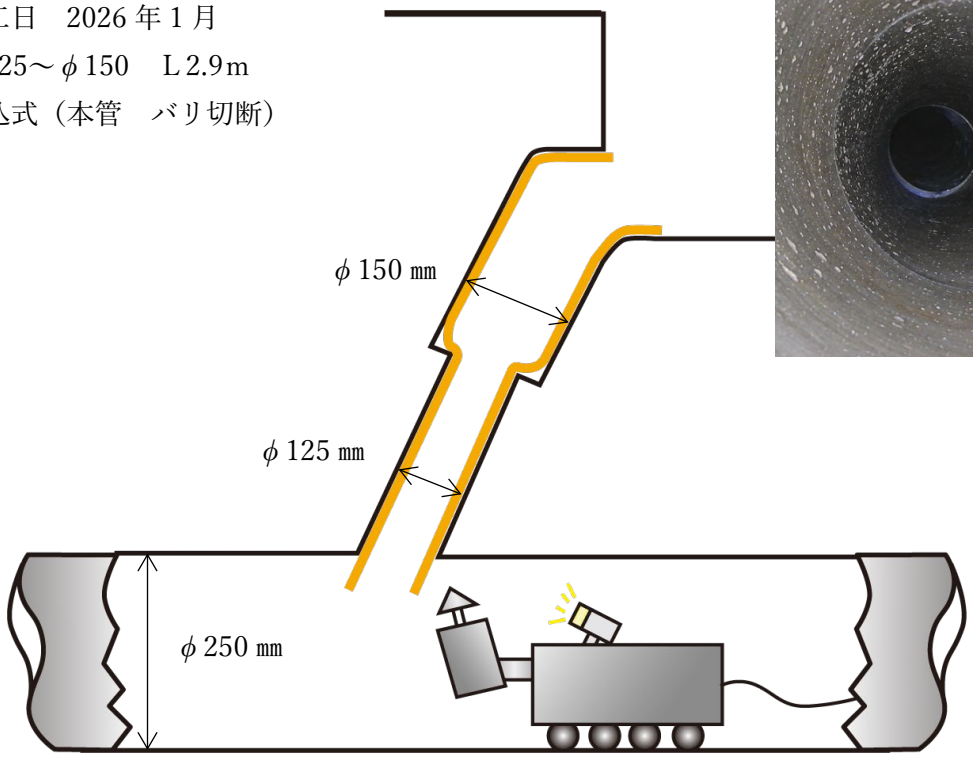

No.2　取付管途中ライニング

工事名　鴨川第 24 処理分区下水道工事（北再-R7-3007）
施工日　2026 年 1 月
φ125　L 4 .9m
引込式（本管　バリ切断）

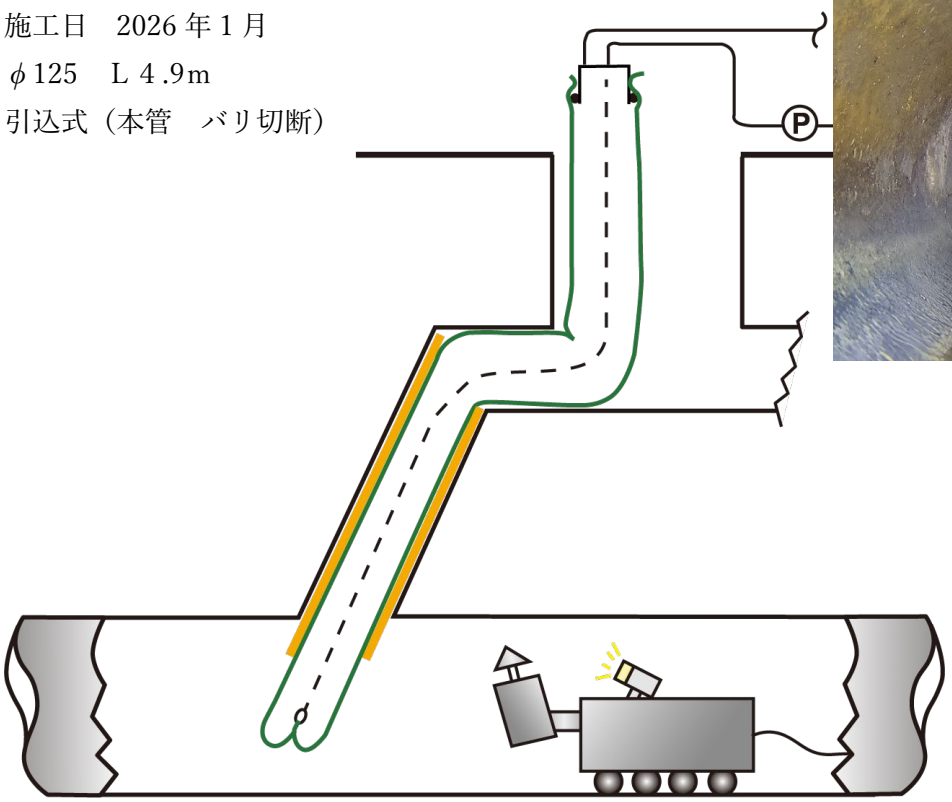

No.3　小口径　マスφ200、φ125 の取付管

工事名　鴨川第 20 処理分区外下水道工事（北再-R7-452)(補)
施工日　2026 年 7 月
φ125　L1.95～6.55m　9 本
ツバ付引込式

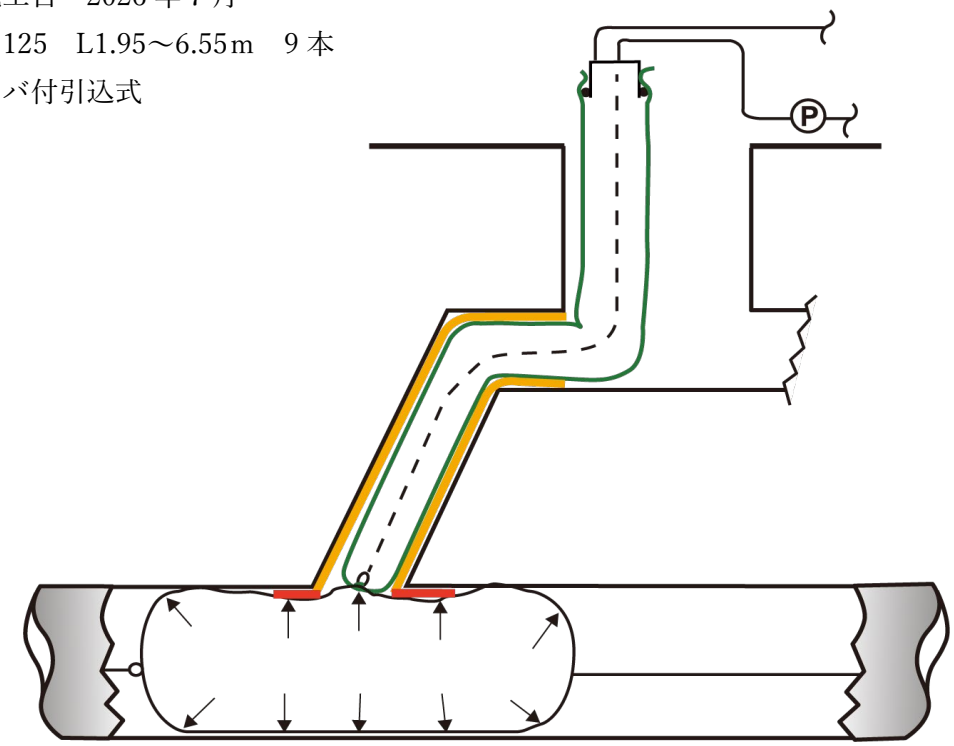

No.4　曲りの多い取付管ライニング
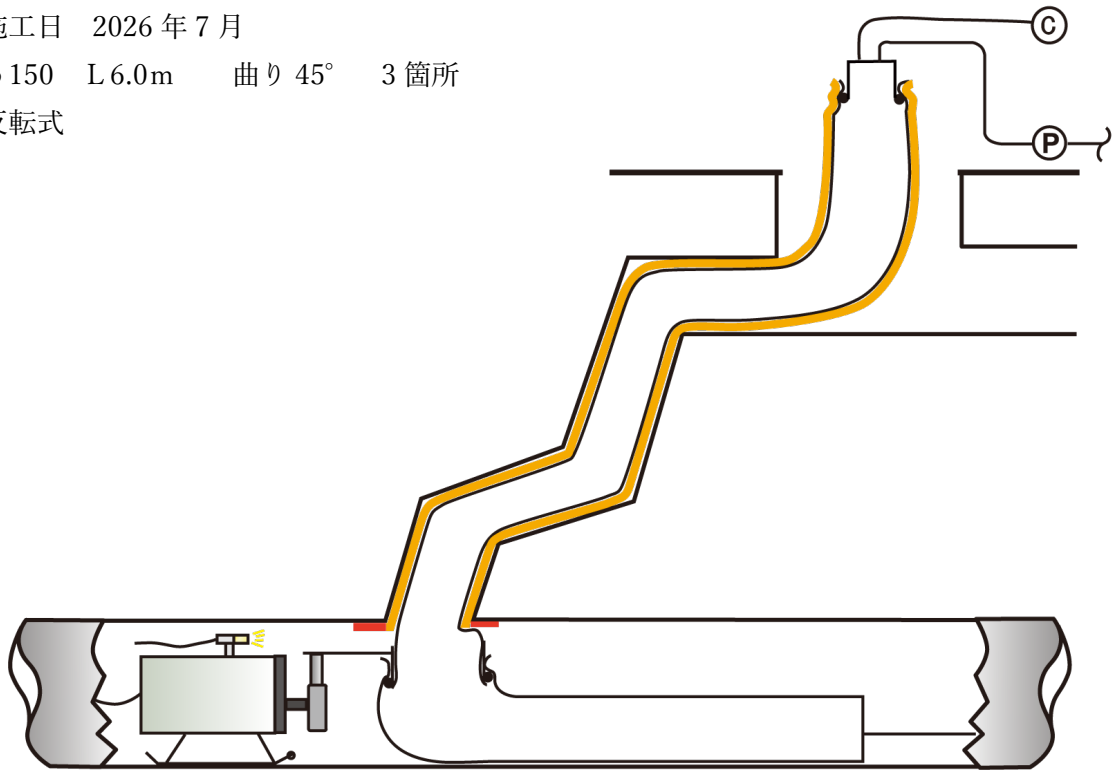
工事名　鴨川第 21 処理分区外下水道工事（北再-R8-3002）
施工日　2026 年 7 月
φ150　L 6.0m　　曲り 45°　　3 箇所
反転式
